

巴音郭楞蒙古自治州 2021年预算绩效评价报告

项目名称：义务教育项目补助资金

项目单位：巴音郭楞蒙古自治州第二中学

主管部门：巴音郭楞蒙古自治州教育局

委托单位：巴音郭楞蒙古自治州财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

主评人：



2022 年 8 月

目录

摘 要	1
一、 项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	1
(三) 资金来源及使用情况	2
(四) 项目组织与管理情况	2
(五) 项目绩效目标	4
二、 评价工作概述	5
(一) 评价目的与原则	5
(二) 评价方法	6
(三) 绩效评价指标体系	7
(四) 评价组织实施	8
三、 评价结论	9
四、 绩效评价分析	12
(一) 绩效目标分析	12
(二) 项目管理分析	13
(三) 项目绩效分析	13
五、 存在问题	14
六、 相关建议	15
七、 其他需要说明的问题	15
附件一 综合评分表	17
附件二 问卷调查报告	26
附件三 满意度问卷	30

附件四 访谈报告 32

附件五 数据需求表 36

附件六 现场采集资料 38

附件七 项目工程延期说明 40

摘 要

一、项目概述

（一）项目概况

为进一步推进教育事业的发展，优化教育资源配置，全面提升全校教育水平，改善学校薄弱环节与能力提升，推动教育优质均衡发展。根据自治区财政厅、教育厅《关于拨付义务教育项目补助资金（新增地方政府债券）的通知》（新财教〔2021〕98号）、《巴州二中2021年发展规划》及《“十四五”期间办学条件》要求，巴音郭楞蒙古自治州第二中学（以下简称：巴州二中）整体办学条件与办学标准存在差距，基础设施有待进一步改善，主要体现在操场无观众看台及遮阳棚等设施。因此2021年安排义务教育项目补助资金210万用于运动场新建观众看台、遮阳棚，以改善学校基础设施建设，提高办学条件，给师生创造一个更舒适的活动空间，促进学校教育教学质量的提升。

（二）项目实施情况

该项目于2021年8月1日开工，2022年2月项目完工，完成修建遮阳棚面积1329.51平方米、修建看台面积942平方米、修建遮阳棚工程1个以及修建看台1个。

（三）绩效目标

1.总目标

在运动场新建观众看台、遮阳棚，改善学校基础设施建设，提高办学条件，给师生创造一个更舒适的活动空间，促进学校教育教学质量的提升。

2.年度绩效目标

本项目资金 2021 年度绩效目标如下：

2021年义务教育项目补助资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	修建遮阳棚面积	≥ 1329.51 平方米
	数量指标	修建看台面积	≥ 942 平方米
	数量指标	修建遮阳棚工程数量	=1 个
	数量指标	修建看台数量	=1 个
	质量指标	看台竣工验收合格率	=100%
	质量指标	看台设计变更率	$\leq 2\%$
	质量指标	遮阳棚工程竣工验收合格率	=100%
	质量指标	遮阳棚工程设计变更率	$\leq 2\%$
	质量指标	看台资金支付率	=100%
	质量指标	遮阳棚工程资金支付率	=100%
	时效指标	看台按计划开工时间	2021 年 8 月
	时效指标	遮阳棚工程按计划开工时间	2021 年 8 月
	时效指标	看台按计划完工时间	2021 年 12 月
	时效指标	遮阳棚工程按计划完工时间	2021 年 12 月
	成本指标	遮阳棚工程款	≤ 140 万元
	成本指标	看台费用	≤ 70 万元
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥ 3200 人
		正常运转率	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目的综合满意度	$\geq 85\%$

二、绩效评价情况

（一）评价结论

总体来看，对义务教育项目补助资金实行了独立客观的评价，在项目立项、资金落实、项目实施、财务管理等方面达到预期效果。最终评分结果为 93.5 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

2021 年安排义务教育项目补助资金资金 210 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出 210 万元，执行率 100%。

（三）项目绩效情况

完成了看台和遮阳棚建设项目。经核查，巴州二中义务教育项目补助资金，新建观众看台 942 平方米、遮阳棚 1329.51 平方米，给师生创造一个更舒适的活动空间，促进学校教育教学质量的提升。

运动场看台和遮阳棚已投入使用。经核查，巴州二中义务教育项目补助资金，全面投入使用，项目受益人数达到 3200 人，正常运转达到 95%，师生满意度达到 85%。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.专项资金管理办法制定较为健全，资金支出合理合规

巴州二中根据内部财务管理制度严格使用资金，对资金的来源、开支范围进行了明确规定。按照实际情况合理编制预算，预算单位综合负责预算的编制、执行和上报等工作。经查证该项目经费使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金于 2021 年 7 月拨付到位，符合项目预

算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.招标过程规范，合同管理完备

巴州二中义务教育项目补助资金按规定进行了科学规范的招标程序，委托招标代理机构进行招标，招标工作报告保存完整；项目程序合法、合规。合同管理规范、完备。

（二）存在的问题与不足

1.前期对项目调研不够全面深入，造成工程延期

前期对项目调研不够全面深入，项目工期延期两个月，项目实际完成进度与年初工作计划不一致。首先项目施工期间由于受新冠疫情影响，无法按时到货，拖延时间 20 天。二是原设计图纸中主席台设计变更，由以前的钢筋混凝土结构改为钢结构，图纸变更时间为 10 天。三是由于受风雨操场原基础回填原因的影响，工期延期约为 12 天。四是因施工工地在该校校园，为了不影响师生正常的上课和考试，有噪声的施工就放在课间和周天实施，为了学生安全，施工场地进材料均在上课时间。因此工期延期约为 18 天。综上，工期延期约为 60 天。

2.项目预算绩效管理工作的规范性有待提高

本项目按照预算绩效管理要求进行了项目绩效目标申报、项目监控、项目评价。但单位提供的项目绩效管理相关资料中发现项目实施过程中未能持续监管好各个环节的正常开展。项目支出绩效监控表、项目支出绩效自评表中实际完成值与项目实际完成情况不符。

（三）建议和改进措施

1.全面深入开展前期项目调研

针对前期对项目调研不够全面深入的问题，建议开展项目年初计划时，认真研究项目特点及现实因素，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的年初计划，保障工作计划的有效完成。

2.强化绩效管理责任意识，提高预算绩效管理能力

牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现。持续监管好各个环节的正常开展，在项目监控和自评阶段需要确保项目绩效目标与申报时一致，若有变更需要提供相应的说明材料。

2021 年义务教育项目补助资金绩效评价报告

为客观反映专项资金执行情况及实施效果，受巴音郭楞蒙古自治州财政局（以下简称：巴州财政局）委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担《义务教育项目补助资金（新增地方政府债券）》项目绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合政策特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

为进一步推进教育事业的发展，优化教育资源配置，全面提升全校教育水平，改善学校薄弱环节与能力提升，推动教育优质均衡发展。根据自治区财政厅、教育厅《关于拨付义务教育项目补助资金（新增地方政府债券）的通知》（新财教〔2021〕98号）、《巴州二中2021年发展规划》及《“十四五”期间办学条件》要求，巴州二中整体办学条件与办学标准存在差距，基础设施有待进一步改善，主要体现在操场无观众看台及遮阳棚等设施。因此2021年安排义务教育项目补助资金210万用于运动场新建观众看台、遮阳棚，以改善学校基础设施建设，提高办学条件，给师生创造一个更舒适的活动空间，促进学校教育教学质量的提升。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

在运动场新建观众看台一个、新建遮阳棚一个，促进学校的办学品位和办学水平。

2.项目规模及范围

该项目资金规模 210 万元，项目支出范围涉及新建观众看台 942 平方米、遮阳棚 1329.51 平方米，具体建设内容为搭建钢筋混凝土独立基础、1.5 米高砖混结构主席台、钢结构遮阳棚和膜结构遮阳棚。

3.评价时段

本次巴州二中义务教育项目补助资金的评价时段为：2021 年 7 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（三）资金来源及使用情况

本项目资金 210 万元来源为一般政府债券资金，资金已于 2021 年 7 月随部门预算批复到位。截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出 210 万元，资金执行率 100%。遮阳棚工程款 140 万元，看台费用 70 万元。严格执行各项财务管理制度，保证项目经费专款专用。支出明细详见下表 1-1：

表1-1 资金支付情况

供应商名称	明细内容	实际支出（万元）
新疆伟邦建筑工程有限公司	支付遮阳棚建设项目 30%预付款	61.53
新疆伟邦建筑工程有限公司	支付分校运动场移动看台及遮阳棚（第二笔）	148.47
合计		210.00

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况

本项目资金拨付部门为巴州财政局、巴音郭楞蒙古自治州教育局（以下简称：巴州教育局），项目实施部门为新疆巴州二中及新疆伟邦建筑工程有限公司，各单位职责如下：

巴州财政局：负责审核资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项补助资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对资金使用情况进行绩效评价等。

巴州教育局：主要负责审核、批复项目资金的年度预（决）算及项目资金拨付、资金使用的监督管理，根据项目资金预算和项目管理结果及时拨付资金，并对项目资金使用情况进行绩效评价。

巴州二中：新建运动场看台，提高办学条件，创造一个更舒适的活动空间，促进教育教学质量的提升。项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。以实现巴州二中预算监督部门对预决算资金的安排、拨付和使用情况进行实时监督。

新疆伟邦建筑工程有限公司：在按照法律法规及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

巴州二中、新疆伟邦建筑工程有限公司和财政等有关部门机构之间加强沟通协调，互相支持配合。

2.资金管理情况

预算编制：按照《巴州二中 2021 年发展规划》及《“十四五”期间办学条件》的要求及巴州二中党委会会议规定程序申请设立，具体支出内容根据预算安排进行测算，由巴州二中编制预算上报巴州财政局，预算经巴州二中党委会审议后批复。

资金拨付：该项目资金支出预算经法定程序批准后，巴州财政局及时分配下达到巴州二中；专项资金严格按照资金拨付程序、年度项目计划和项目进度拨付，确保项目资金使用合理合规、安全有效。

（五）项目绩效目标

1.总目标

在运动场新建观众看台、遮阳棚，改善学校基础设施建设，提高办学条件，给师生创造一个更舒适的活动空间，促进学校教育教学质量的提升。

2.年度绩效目标

本专项资金2021年度绩效目标如下：

表1-2 2021年义务教育项目补助资金
年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	修建遮阳棚面积	≥ 1329.51 平方米
	数量指标	修建看台面积	≥ 942 平方米

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	修建遮阳棚工程数量	=1 个
	数量指标	修建看台数量	=1 个
	质量指标	看台竣工验收合格率	=100%
	质量指标	看台设计变更率	<=2%
	质量指标	遮阳棚工程竣工验收合格率	=100%
	质量指标	遮阳棚工程设计变更率	<=2%
	质量指标	看台资金支付率	=100%
	质量指标	遮阳棚工程资金支付率	=100%
	时效指标	看台按计划开工时间	2021 年 8 月
	时效指标	遮阳棚工程按计划开工时间	2021 年 8 月
	时效指标	看台按计划完工时间	2021 年 12 月
	时效指标	遮阳棚工程按计划完工时间	2021 年 12 月
	成本指标	遮阳棚工程款	<=140 万元
	成本指标	看台费用	<=70 万元
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=3200 人
		正常运转率	>=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目的综合满意度	>=85%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则

则。通过对义务教育项目补助资金(新增地方政府一般债券)专项资金进行绩效评价,旨在了解项目资金使用和项目管理情况,同时,通过对该资金扶持的项目所达到的效益进行考量,分析该项目对覆盖区域群众推广所产生的效益,以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

(二) 评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地核查法等多种方法,具体评价方法如下:

文献法:通过检索、查阅、梳理“新财教〔2021〕98号下达义务教育项目补助资金(新增地方政府债券新建运动场(含看台))”国家、省级相关的政策文件、会议纪要等相关材料,了解“新财教〔2021〕98号下达义务教育项目补助资金(新增地方政府债券新建运动场(含看台))”项目立项依据的充分性及立项的规范性。

社会调查法:社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法,同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对巴州二中义务教育项目补助资金带头人、相关技术人员、承试单位人员等进行充分调研,更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等,为评价指标评分和结果分析提供支撑。

实地核查法:通过查账了解项目资金实际开支情况,包括是否专款专用、是否按标准支出。通过核查实施单位专项

资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额等，核实各项支出是否按照相关财务管理制度、合同约定等执行，是否存在超范围列支的情况。通过义务教育项目补助资金建设情况，核实看台及遮阳棚等设施建设是否可以正常运行；看台及遮阳棚等设施建设使用情况及使用效果。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设

置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为巴州财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	李刚	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	张琳娜	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	喻盼盼	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	杨英	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	梁亚鹏	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	张梦梦	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日，具体安排如下：

（1）数据采集（2022 年 8 月 5 日前）受巴州财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

（2）实地调研（2022 年 8 月 13 日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核，调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）撰写评价报告（2022 年 8 月 20 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交巴州财政局，由巴州财政局征求预算主管部门意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

（4）报告提交（2022 年 8 月 31 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交巴州财政局，并根据巴州财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对“义务教育项目补助资金（新增地方政府一

般债券)”项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 93.5 分，评价等级为“优”，各部分得分情况详见表。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	19.5	97.5%
项目管理	20	19	95%
项目产出	40	35	87.5%
项目效益	20	20	100%
合计	100	93.5	93.5%

各项指标得分情况见下表：

表 3-2 项目指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 决策(20)	A1 项目立项(6)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标(9)	A201 绩效目标合理性	5	合理	合理	5	100%
		A202 绩效指标明确性	4	明确	较明确	3.5	87.5%
	A3 资金投入(5)	A301 预算编制科学性	3	合理	合理	3	100%
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%
B 过程(20)	B1 资金管理(14)	B101 资金到位率	5	100%	100%	5	100%
		B102 预算执行率	6	100%	100%	6	100%
		B103 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
	B2 组织实施(6)	B201 管理制度健全性	2	健全	健全	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		B202 制度执行有效性	2	有效	有效	2	100%
		B203 绩效管理合规性	2	合规	较合规	1	50%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量(10)	C101 修建遮阳棚面积	2.5	≥1329.51 平方米	1329.51 平方米	2.5	100%
		C102 修建看台面积	2.5	≥942 平方米	942 平方米	2.5	100%
		C103 修建遮阳棚工程数量	2.5	=1 个	1 个	2.5	100%
		C104 修建看台数量	2.5	=1 个	1 个	2.5	100%
	C2 产出质量(15)	C201 看台竣工验收合格率	2.5	=100%	100%	2.5	100%
		C202 看台设计变更率	2.5	≤2%	2%	2.5	100%
		C203 遮阳棚工程竣工验收合格率	2.5	=100%	100%	2.5	100%
		C204 遮阳棚工程设计变更率	2.5	≤2%	2%	2.5	100%
		C205 看台资金支付率	2.5	=100%	100%	2.5	100%
		C206 遮阳棚工程资金支付率	2.5	=100%	100%	2.5	100%
	C3 产出时效(10)	C301 看台按计划开工时间	2.5	2021 年 8 月	2021 年 8 月	2.5	100%
		C302 遮阳棚工程按计划开工时间	2.5	2021 年 8 月	2021 年 8 月	2.5	100%
		C303 看台按计划完工时间	2.5	2021 年 12 月	2022 年 2 月	0	0%
		C304 遮阳棚工程按计划完工时间	2.5	2021 年 12 月	2022 年 2 月	0	0%
	C4 产出成本(5)	C401 遮阳棚工程款	2.5	≤140 万元	140 万元	2.5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		C402 看台费用	2.5	≤70 万元	70 万元	2.5	100%
D 项目效益 (20)	D1 项目效果 (13)	D101 项目受益人数	6	≥3200 人	3200 人	6	100%
		D102 正常运转率	7	≥95%	95%	7	100%
	D2 满意度 (7)	D201 教师、学生对项目的综合满意度	7	≥85%	85%	7	100%
总分			100	-	-	93.5	93.5%

四、绩效评价分析

(一) 绩效目标分析

绩效目标总体设置缺乏准确性。年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制，但存在以下不明确之处：前期对项目调研不够全面深入，项目在实施的过程中存在一些改变，导致项目绩效目标在中期需做一些调整，调整后的项目绩效目标与年初设定的绩效目标存在些许偏差。

表 4-1 项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标问题
产出指标	数量指标	修建遮阳棚面积	≥1329.51 平方米	
	数量指标	修建看台面积	≥942 平方米	
	数量指标	修建遮阳棚工程数量	=1 个	
	数量指标	修建看台数量	=1 个	
	质量指标	看台竣工验收合格率	=100%	
	质量指标	看台设计变更率	≤2%	
	质量指标	遮阳棚工程竣工验收合格率	=100%	
	质量指标	遮阳棚工程设计变更率	≤2%	
	质量指标	看台资金支付率	=100%	
	质量指标	遮阳棚工程资金支付率	=100%	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标问题
	时效指标	看台按计划开工时间	2021 年 8 月	
	时效指标	遮阳棚工程按计划开工时间	2021 年 8 月	
	时效指标	看台按计划完工时间	2021 年 12 月	
	时效指标	遮阳棚工程按计划完工时间	2021 年 12 月	
	成本指标	遮阳棚工程款	≤140 万元	
	成本指标	看台费用	≤70 万元	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥3200 人	
	社会效益指标	正常运转率	≥95%	
满意度指标	满意度指标	教师、学生对项目的综合满意度	≥85%	

（二）项目管理分析

专项资金管理办法制定较为健全，资金支出合理合规。

巴州二中根据内部财务管理制度严格使用资金，对资金的来源、开支范围进行了明确规定。按照实际情况合理编制预算，预算单位综合负责预算的编制、执行和上报等工作。经查证该项目经费使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金于 2021 年 7 月拨付到位，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

招标过程规范，合同管理完备。巴州二中义务教育项目补助资金按规定进行了科学规范的招标程序，委托招标代理机构进行招标，招标工作报告保存完整；项目程序合法、合规。合同管理规范、完备。

（三）项目绩效分析

完成了看台和遮阳棚建设项目。经核查，巴州二中义务教育项目补助资金，新建观众看台 942 平方米、遮阳棚 1329.51 平方米，给师生创造一个更舒适的活动空间，促进学校教育教学质量的提升。

运动场看台和遮阳棚已投入使用。经核查，巴州二中义务教育项目补助资金，全面投入使用，项目受益人数达到 3200 人，正常运转达到 95%，师生满意度达到 85%。

五、存在问题

总体来看，义务教育项目补助资金全部验收完毕。看台和遮阳棚均已投入使用。给师生创造一个更舒适的活动空间。但在评价过程中发现，本项目在管理过程中仍存在问题，需要加以调整。

（一）前期对项目调研不够全面深入，造成工程延期

前期对项目调研不够全面深入，项目工期延期两个月，项目实际完成进度与年初工作计划不一致。首先项目施工期间由于受新冠疫情影响，无法按时到货，拖延时间 20 天。二是原设计图纸中主席台设计变更，由以前的钢筋混凝土结构改为钢结构，图纸变更时间为 10 天。三是由于受风雨操场原基础回填原因的影响，工期延期约为 12 天。四是因施工工地在该校校园，为了不影响师生正常的上课和考试，有噪声的施工就放在课间和周天实施，为了学生安全，施工场地进材料均在上课时间。因此工期延期约为 18 天。综上，工期延期约为 60 天。

（二）项目预算绩效管理工作的规范性有待提高

本项目按照预算绩效管理要求进行了项目绩效目标申报、项目监控、项目评价。但单位提供的项目绩效管理相关资料中发现项目实施过程中未能持续监管好各个环节的正常开展。项目支出绩效监控表、项目支出绩效自评表中实际完成值与项目实际完成情况不符。

六、相关建议

（一）全面深入开展前期项目调研

针对前期对项目调研不够全面深入的问题，建议开展项目年初计划时，应认真研究项目特点及现实因素，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的年初计划，保障工作计划的有效完成。

（二）强化绩效管理责任意识，提高预算绩效管理能力

牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现。持续监管好各个环节的正常开展，在项目监控和自评阶段需要确保项目绩效目标与申报时一致，若有变更需要提供相应的说明材料。

七、其他需要说明的问题

为了准确反映项目管理情况及实施效果，评价组根据巴州二中义务教育项目补助资金负责人提供所需的项目材料，满意度调查问卷结果，针对上述情况，评价组在对有限的数据进行分析的基础上，结合对相关部门，对本项目的实施效果进行了客观评价。

看台及遮阳棚等设施建设均已验收完成，以改善巴州二

中基础设施建设，提高办学条件，给师生创造一个更舒适的活动空间，促进巴州二中教育教学质量的提升。

评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。

附件一 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
A 决策 (20)	A1 项目 立项 (6)	A101 立 项依据充 分性	3	项目立项是否 符合法律法 规、相关政策、 发展规划以及 部门职责, 用 以反映和考核 项目立项依据 情况。	充分	通用标准	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律 法规、国民经济发展规划和相关 政策; (0.6 分) ②项目立项是 否符合行业发展规划和政策要 求; (0.6 分) ③项目立项是否 与部门职责范围相符, 属于部门 履职所需; (0.6 分) ④项目是 否属于公共财政支持范围, 是否 符合中央、地方事权支出责任划 分原则; (0.6 分) ⑤项目是否 与相关部门同类项目或部门内 部相关项目重复 (0.6 分)	①项目立项依据根据《巴州二中 2021 年发展规划》及《“十四五” 期间办学条件》, 因学校操场无观 众看台及遮阳棚等设施, 学校计划 用这笔钱在运动场新建观众看台、 遮阳棚, 以改善学校基础设施建 设, 提高办学条件, 给师生创造一 个更舒适的活动空间, 促进学校教 育教学质量的提升。 ②项目属于公共财政支持范围, 与 相关部门项目不重复。立项依据充 分综上, 该指标得满分 3 分。	3	100%
		A102 立 项程序规 范性	3	项目申请、设 立过程是否符 合相关要求, 用以反映和考 核项目立项的 规范情况。	规范	通用标准	评价要点: ①项目是否按照规定的 程序申请设立; (1 分) ②审 批文件、材料是否符合相关要 求; (1 分) ③事前是否已经过 必要的可行性研究、专家论证、 风险评估、绩效评估、集体决策。 (1 分)	①项目立项是依据《新财教〔2021〕 98 号下达义务教育项目补助资金 (新增地方政府债券新建运动场 (含看台)工作实施方案》工作指 导意见设立; ②审批文件、材料符 合相关; ③事前已做事前绩效评估 报告、项目实施计划。综上, 该指 标得满分 3 分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
	A2 绩效目标（9）	A201 绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	通用标准	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；（1.25分）②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1.25分）③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1.25分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1.25分）	①根据《新财教〔2021〕98号下达义务教育项目补助资金（新增地方政府债券新建运动场（含看台）绩效目标申报表》等相关材料，本项目设立了总目标和年度目标；②根据工作进展情况的报告里的实际内容，以及现场考察，绩效目标与实际工作内容一致；③依据项目跟踪报告中体现，项目产出与效果符合正常水平④项目预算210万元与确定的项目投资额相匹配。综上，该指标得满分5分。	5	100%
		A202 绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	通用标准	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1.5分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1.5分）③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	①根据《义务教育项目补助资金绩效目标申报表》，绩效目标细化分解了19条具体的三级指标，故得权重分1.5分；②部分指标存在不够清晰、不可衡量的指标值，故得1分；③指标与项目计划数相对应，故得权重分1分。综上，该项指标得3.5分。	3.5	87.5%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
	A3 资金投入（5）	A301 预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；（0.75分）②预算内容与项目内容是否匹配；（0.75分）③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.75分）④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.75分）	①新财教〔2021〕98号下达义务教育项目补助资金新增地方政府债券新建运动场看台项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据《巴州二中2021年发展规划》及《“十四五”期间办学条件》的要求及《巴州二中党委会》，按照标准编制。预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，经费使用合理；②该项目2021年预算支出事前绩效评估与项目内容匹配；③预算额度测算依据年初部门预算；④项目投资210万元，与绩效目标工作量完成匹配。综上，该项指标得3分。	3	100%
		A301 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的	合理	通用标准	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；（1分）②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	①预算资金分配依据《巴州二中2021年发展规划》及《“十四五”期间办学条件》的要求及《巴州二中党委会》进行充分分配，资金分配额度合理，与项目管理办法及支付实际相适应。综上，该项指标得2分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
				科学性、合理性情况。						
B 过程 (20)	B1 资金管理(14)	B101 资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	通用标准	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。(5分) 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	巴州财政局按照预算分配方案,将预算资金足额、及时拨付至巴州二中,根据评分标准该指标得满分。	5	100%
		B102 预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	通用标准	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。(6分)。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算本项目预算总额 210 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,实际支出 210 万元,预算执行率 100%,根据评分标准,该指标得 6 分。	6	100%
		B103 资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(0.75分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.75分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(0.75分)④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.75分)	①本项目专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付依据财政平台以及财务流程按正规的审批程序拨付;③发票、合同与预算保持一致;④剩余质保金财政已收回,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上,该指标得满分 3 分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
	B2 组织实施（6）	B201 管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1分）②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	该项目制定新财教〔2021〕98号下达义务教育项目补助资金新增地方政府债券新建运动场看台项目制定了相应的财务和业务管理制度，建立了巴州二中内控管理制度，制度合法、合规、完整，此项目严格按照预算制度及财务管理制度执行。综上，该指标得满分2分。	2	100%
		B202 制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（0.5分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（0.5分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（0.5分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（0.5分）	①中标通知书、招投标资料、发票等资料进行印证、工作进展情况的报告、项目跟踪报告、绩效监控情况表、自评表、自评报告项目在执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目无调整；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。综上，该指标得满分2分。	2	100%
		B203 绩效管理合规性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映绩效管理合规	合规	通用标准	评价要点：考察实施单位①是否已制定或具有预算绩效管理实施方案；②项目实施方案是否完整（事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效自评和结果应用）；③绩效管理	①已制定或具有预算绩效管理实施方案；②项目实施方案完整（事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效自评和结果应用）；③绩效管理	1	50%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
				性。			监控、绩效自评和结果应用)； ③绩效管理工作是否按照实施方案严格执行。三项各占 25%、25%、50%的权重分，满足一项得对应的权重分。	工作按照实施方案严格执行。但项目支出绩效监控表、项目支出绩效自评表中实际完成值与实际完成情况有出入。综上该指标得 1 分。		
C 产出 (40)	C1 产出 数量(10)	C101 修建遮阳棚面积	2.5	考察修建遮阳棚面积	>=1329.51 平方米	计划标准	达到目标值得满分，未达到或超过不得分。	依据合同，现场考察，修建遮阳棚面积 1329.51 平方米，综上，该指标得满分 2.5 分	2.5	100%
		C102 修建看台面积	2.5	考察修建看台面积	>=942 平方米	计划标准	达到目标值得满分，未达到或超过不得分。	依据合同，现场考察，修建遮阳棚面积 942 平方米，综上，该指标得满分 2.5 分	2.5	100%
		C103 修建遮阳棚工程数量	2.5	考察修建遮阳棚数量	=1 个	计划标准	达到目标值得满分，未达到或超过不得分。	依据合同，现场考察，完成考察修建遮阳棚数量 1 个，综上，该指标得满分 2.5 分	2.5	100%
		C104 修建看台数量	2.5	考察修建看台数量	=1 个	计划标准	达到目标值得满分，未达到或超过不得分。	依据合同，现场考察，完成考察修建看台数量 1 个，综上，该指标得满分 2.5 分	2.5	100%
	C2 产出 质量(15)	C201 看台竣工验收合格率	2.5	考察看台竣工验收合格率	=100%	计划标准	到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	依据工程验收报告，设看台竣工验收合格率为 100%，综上，该指标得满分 2.5 分	2.5	100%
		C202 看台设计变更率	2.5	考察看台设计变更率	<=2%	计划标准	到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组依据合同、整改报告、延期说明等佐证材料证明，2021 年台设计变更率为 2%，综上，该指标	2.5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
								得满分 2.5 分		
		C203 遮阳棚工程竣工验收合格率	2.5	考察遮阳棚工程竣工验收合格率	=100%	计划标准	到目标值得满分,未达到目标值按比例扣分,扣完为止。	评价组依据工程验收报告佐证材料证明,2021 年遮阳棚工程竣工验收合格率为 100%, 综上,该指标得满分 2.5 分	2.5	100%
		C204 遮阳棚工程设计变更率	2.5	考察遮阳棚工程设计变更率	≤2%	计划标准	到目标值得满分,未达到目标值按比例扣分,扣完为止。	评价组依据合同佐证材料证明,2021 年遮阳棚工程设计变更率为 2%, 综上,该指标得满分 2.5 分	2.5	100%
		C205 看台资金支付率	2.5	考察看台资金支付率	=100%	计划标准	到目标值得满分,未达到目标值按比例扣分,扣完为止。	评价组依据合同佐证材料证明,2021 年看台资金支付率台资金支付率都达标为 100%, 综上,该指标得满分 2.5 分	2.5	100%
		C206 遮阳棚工程资金支付率	2.5	考察遮阳棚工程资金支付率	=100%	计划标准	到目标值得满分,未达到目标值按比例扣分,扣完为止。	评价组依据合同佐证材料证明,2021 年遮阳棚工程资金支付率为 100%, 综上,该指标得满分 2.5 分	2.5	100%
	C3 产出时效(10)	C301 看台按计划开工时间	2.5	考察看台按计划开工时间	2021 年 8 月	计划标准	达到目标值得满分,超出则不得分。	评价组根据项目验收报告和施工合同佐证材料证明 2021 年实际完成看台按计划开工时间为 2021 年 8 月,根据评分标准,该指标得满分。	2.5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
		C302 遮阳棚工程按计划开工时间	2.5	考察遮阳棚工程按计划开工时间	2021年8月	计划标准	达到目标值得满分,超出则不得分。	评价组根据项目验收报告和施工合同佐证材料证明 2021 年实际完成遮阳棚工程按计划开工时间为 2021 年 8 月, 根据评分标准, 该指标得满分。	2.5	100%
		C303 看台按计划完工时间	2.5	考察看台按计划完工时间	2021年12月	计划标准	达到目标值得满分,超出则不得分。	评价组根据项目验收报告和施工合同佐证材料证明 2021 年实际完成看台按计划完工时间为 2022 年 2 月, 根据评分标准, 该指标不得分。	0	0%
		C304 遮阳棚工程按计划完工时间	2.5	考察遮阳棚工程按计划完工时间	2021年12月	计划标准	达到目标值得满分,超出则不得分。	评价组根据项目验收报告和施工合同佐证材料证明 2021 年实际完成遮阳棚工程按计划完工时间为 2022 年 2 月, 根据评分标准, 该指标不得分。	0	0%
	C4 产出成本 (5)	C401 遮阳棚工程款	2.5	考察修建遮阳棚工程款支出金额	≤140万元	计划标准	达到目标值得满分,超出则不得分。	遮阳棚工程款 140 万, 截至2021年 12 月 31 日, 已实际支付修建你遮阳棚工程款 140 万元, 综上, 该指标得满分 2.5 分	2.5	100%
		C402 看台费用	2.5	考察修建看台支出金额	≤70万元	计划标准	达到目标值得满分,超出则不得分。	看台费用 70 万, 截至2021年12月 31 日, 已实际支付修建看台费用 70 万元, 综上, 该指标得满分 2.5 分	2.5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
效益（20）	D1 项目效果（23）	D101 项目受益人数	6	项目实施所产生的效益。	≥3200 人	历史与经验标准	达到或超过目标值得满分，未达到不得分。	评价组依据学校人员名单佐证材料证明，2021 年项目项目受益人数 3200 人，综上，该指标得满分 6 分	6	100%
		D102 正常运转率	7	项目实施所产生的效益。	≥95%	历史与经验标准	到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组依据工作进展情况的报告及现场调研，看台及遮阳棚正常运转。项目实施所产生的效益为 95%，故该指标得 7 分	7	100%
	D2 满意度（7）	D201 教师、学生对项目的综合满意度	7	考察教师、学生对项目的综合满意度	≥85%	历史与经验标准	到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	依据项目调查问卷教师、学生对项目的综合满意度均达到 85%，故该指标得 7 分	7	100%
总分			100	-	-	-	-	-	93.5	93.5%

附件二 问卷调查报告

巴州二中全体师生满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为巴州二中教师、学生。

（二）调研内容

1.单选题：

您是老师还是学生？

您对于新建运动场（含看台、遮阳棚）使用频率？

您对新建运动场（含看台、遮阳棚）是否给师生提供了活动空间？

您对新建运动场（含看台、遮阳棚）建立的态度？

2.满意度问题：

对运动场（含看台）基础设施的满意度？

对新建运动场（含看台、遮阳棚）使用体验满意度？

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

由单位发放评价组提供的问卷二维码，线上回收 194 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach α) 来测量满意度问题的信度, 其计算公式为:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目, σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差, σ_T^2 为总得分的方差。

通常, 克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下, 信度系数在 0.9 以上, 则认为量表的内在信度高; 信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间, 则表示量表信度较高; 信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间, 表示量表具有相当的信度; 信度系数不超过 0.7, 一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示, 本次巴州二中运动场 (含看台、遮阳棚) 调查问卷的信度为 0.85。

2.效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性, 即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为:

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中, $x = x_i - \bar{x}$, 表示题目得分偏差; $y = y_i - \bar{y}$, 表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于 -1 与 $+1$ 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 巴州二中运动场（含看台、遮阳棚）调查问卷效度汇总

题目	效度得分
对运动场（含看台、遮阳棚）基础设施的满意度？	0.93
对新建运动场（含看台、遮阳棚）使用体验满意度？	0.94

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您是老师还是学生？

在 194 份有效问卷中，被调查对象中选老师的比例为 46.91%，选学生的比例为 53.09%。

2) 您对于新建运动场（含看台、遮阳棚）使用频率？

在 194 份有效问卷中，被调查对象中选较高的比例为 50%，选一般的比例为 41.75%，选较低的比例为 8.25%。

3) 您对新建运动场（含看台、遮阳棚）是否给师生提供了活动空间？


在 194 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 95.36%，选否的比例为 4.64%。

4) 您对新建运动场（含看台、遮阳棚）建立的态度？

在 194 份有效问卷中，被调查对象中选支持的比例为 97.94%，选反对的比例为 2.06%。

2.满意度题

根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 86.39%，满意度水平较高。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：对运动场（含看台、遮阳棚）基础设施的满意度？(87.01%)、对新建运动场（含看台、遮阳棚）使用体验满意度？(85.773%)。具体如下图所示。

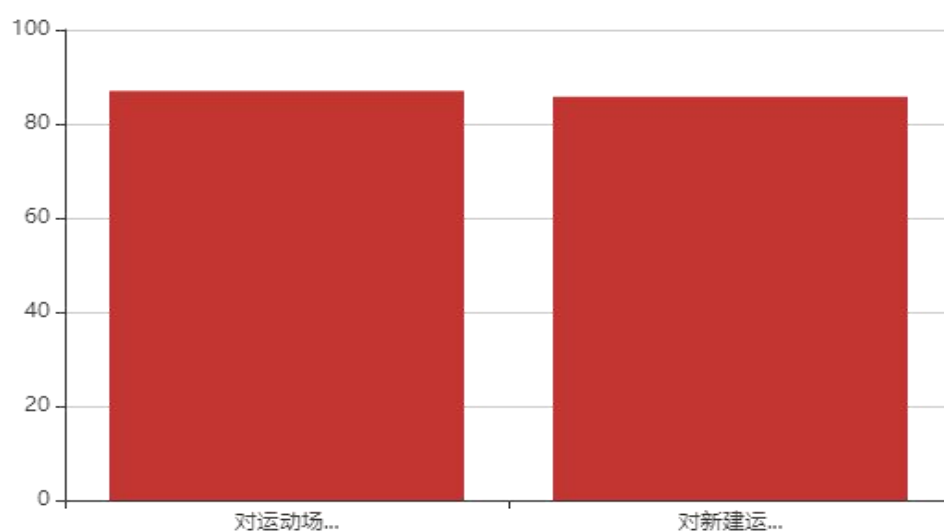

附件三 满意度问卷

2021 年自治区巴州二中运动场（含看台、遮阳棚）满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受巴州财政局的委托，我公司对 2021 年巴州二中运动场（含看台、遮阳棚）项目的受益人员展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2022 年 8 月

一、基本问题

1. 您是老师还是学生？（ ）

A. 学生 B. 老师

2. 您对于新建运动场（含看台、遮阳棚）使用频率？（ ）

A. 较高 B. 一般 C. 较低

3. 您对新建运动场（含看台、遮阳棚）是否给师生提供了活动空间？

（ ）

A. 是 B. 否

4. 您对新建运动场（含看台、遮阳棚）建立的态度？（ ）

A. 支持 B. 反对

二、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5分最高，1分最低。

满意度问题	最高	—————→	最低		
1.对运动场（含看台）基础设施的满意度？	5	4	3	2	1
2.对新建运动场（含看台、遮阳棚）使用体验满意度？	5	4	3	2	1
以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因：					

〈再次感谢您的支持与配合！〉

附件四 访谈报告

2021 年度义务教育项目补助资金绩效评价访谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对专项资金项目的项目管理单位进行访谈，深入了解该专项资金的支出情况、产出和效果目标的实现情况以及相关过程管理情况，客观反映项目实施及管理过程中的主要成效及存在的问题，评价组组织开展了本次实地核查工作。

二、访谈对象

1.财政拨款部门：巴州财政局

2.项目主管单位：巴州二中

三、访谈内容

（一）请您简要谈谈义务教育项目补助资金内容及规模。

该项目计划在运动场新建观众看台一个、新建遮阳棚一个，促进学校的办学品位和办学水平，打造精品校园，改善学校基础设施建设，提高办学条件，给师生创造一个更舒适的活动空间，促进学校教育教学质量的提升。

（二）请您简单谈谈义务教育项目补助资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。

实施过程：2021 年 8 月修建观众看台工程开工；2021 年 12 月修建观众看台工程完工；2021 年 8 月修建遮阳棚工程开工；2021 年 12 月修建遮阳棚工程完工。

资金投入情况：该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 210 万元，实际总投入 210 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 210 万元，全年执行数 210 万元，预算执行率为 100%，用于：遮阳棚工程款 140 万元，看台费用 70 万元。

（三）请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？

专项资金管理办法的主要内容：巴州二中根据内部财务管理制度严格使用资金，对资金的来源、开支范围进行了明确规定。按照实际情况合理编制预算，预算单位综合负责预算的编制、执行和上报等工作

（四）请您谈谈本专项资金实施是否达到了预期效果？

达到了预期效果。运动场看台及遮阳棚已投入使用。提升了教育教学质量。

（五）请您谈谈该专项资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。

项目实施过程中未能持续监管好各个环节的正常开展。

未来的工作规划：健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

（六）从专项资金预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及如何提升。

一是项目支出绩效表中三级指标的设置需要优化，尤其是数量指标；二是项目支出绩效表中三级指标内容应当更准确反映项目目标任，财政、项目主体单位相关人员需要进一步加强沟通，从而提高项目支出绩效评价效率；三是今后对专项资金加强定期监督检查机制，运用聘请第三方机构或者邀请财政部门对专项资金进行监督检查。

（七）该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？

涉及巴州财政局、巴州二中、新疆伟邦建筑工程有限公司。

巴州财政局：负责审核资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项补助资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对资金使用情况绩效评价等。

巴州二中：新建运动场看台，提高办学条件，创造一个更舒适的活动空间，促进教育教学质量的提升。项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。以实现巴州二中预算监督部门对预决算资金的安排、拨付和使用情况进行实时监督。

新疆伟邦建筑工程有限公司：在按照法律法规及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

巴州二中、新疆伟邦建筑工程有限公司和财政等有关部门机构之间加强沟通协调，互相支持配合。

（八）请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？

基本健全。一是科学制定标准，项目建设通过了集体决策、可行性研究。二是严格审批程序，本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行，根据工程情况提出用款申请，财政核拨，专款专用，确保资金及时足额到位。四是总结成功经验，加强研究思考，深化规律认识。

附件五 数据需求表

序号	指标名称	实际完成值	数据来源部门	有无佐证材料	备注
1	修建遮阳棚面积	1329.51 平方米	巴州二中	有	合同
2	修建看台面积	942 平方米	巴州二中	有	合同
3	修建遮阳棚工程数量	1 个	巴州二中	有	中标通知书、合同
4	修建看台数量	1 个	巴州二中	有	财政平台指标管理、明细账
5	看台竣工验收合格率	100%	巴州二中	有	项目竣工验收报告
6	看台设计变更率	2%	巴州二中	有	工作进展情况的报告
7	遮阳棚工程竣工验收合格率	100%	巴州二中	有	项目竣工验收报告
8	遮阳棚工程设计变更率	2%	巴州二中	有	工作进展情况的报告
9	看台资金支付率	100%	巴州二中	有	收付款凭证、发票等

序号	指标名称	实际完成值	数据来源部门	有无佐证材料	备注
10	遮阳棚工程资金支付率	100%	巴州二中	有	收付款凭证、发票等
11	看台按计划开工时间	2021 年 8 月	巴州二中	有	中标通知书、合同
12	遮阳棚工程按计划开工时间	2021 年 8 月	巴州二中	有	中标通知书、合同
13	看台按计划完工时间	2021 年 12 月	巴州二中	有	中标通知书、合同
14	遮阳棚工程按计划完工时间	2021 年 12 月	巴州二中	有	中标通知书、合同
15	遮阳棚工程款	140 万元	巴州二中	有	中标通知书、合同
16	看台费用	70 万元	巴州二中	有	中标通知书、合同
17	项目受益人数	3200 人	巴州二中	无	
18	正常运转率	95%	巴州二中	有	
19	教师、学生对项目的综合满意度	95%	巴州二中	有	师生问卷调查
填写单位：巴州二中 填写人：唐友娥 联系电话：18999625161 填写日期：2022 年 8 月 16 日					
注：此表由巴州二中（办公室）填写；需提供证明相关数据的报告；					

附件六 现场采集资料





附件七 项目工程延期说明

关于巴州第二中学运动场看台及遮阳棚 建设项目工程延期说明

兹有新疆伟邦建筑工程有限公司承建巴州第二中学运动场看台及遮阳棚建设项目，由于受以下不可抗拒的客观原因影响，故造成此项工程延期，特进行情况说明。

一、是本项目所需伸缩看台及膜材料分别从河北沧州和上海两地发货，由于受新冠疫情影响，无法按时到货，拖延时间 20 天。

二、是原设计图纸中主席台设计变更，由以前的钢筋混凝土结构改为钢结构，图纸变更时间为 10 天。

三、由于受风雨操场原基础回填土原因的影响，基础需在原有的基础上进行了一定的超挖，工期延期约为 12 天。

四、因施工工地在贵校校园，为了不影响师生正常的上课和考试，有噪声的施工就放在课间和周天实施，为了学生安全，施工场地进材料都在上课时间进。因此工期延期约为 18 天。

综上所述，本项目工期延期两个月，特此说明！

此致

新疆伟邦建筑工程有限公司

2021 年 12 月 28 日

